"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ "И.В.ПАНФИЛОВ АТЫНДАҒЫ №5 МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №5 ИМЕНИ И.В.ПАНФИЛОВА" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ КЫЗЫЛОРДА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

120019.Қызылорда қаласы, Е.Әуелбеков көшесі,10,
Тел.факс: 8 (7242) 27-63-83
E-mail : 5_litsey@mail.kz

120019,город Кызылорда,улица Е.Ауельбекова,10,
Тел.факс: 8 (7242) 27-63-83
E-mail : 5_litsey@mail.kz


03.07.2026ж
Шығыс №_____ **№_____**
Қызылорда қаласы **город Кызылорда**

Қызылорда қаласы Төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Р.Ерсұлтанұлына

№5 мектеп-лицей әкімшілігі «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда обылысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 2026 жылы 8 мамырдағы №63 бұзушылықты жою туралы нұсқамасында көрсетілген кемшіліктер жойылғандығын мәлімдейді. (қосымша 8-парақ).

"И.В.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицей" КММ директоры **Б. Дуйсенбаев**

1. Адамдар жаппай болатын обьектіде ұйым басшысы жарты жылда кемінде 1 рет еркін нысанда толтырылатын жаттығулар журналы арналмаған және практикалық жаттығулар өткізбеген.Талапқа сай келтірілсін

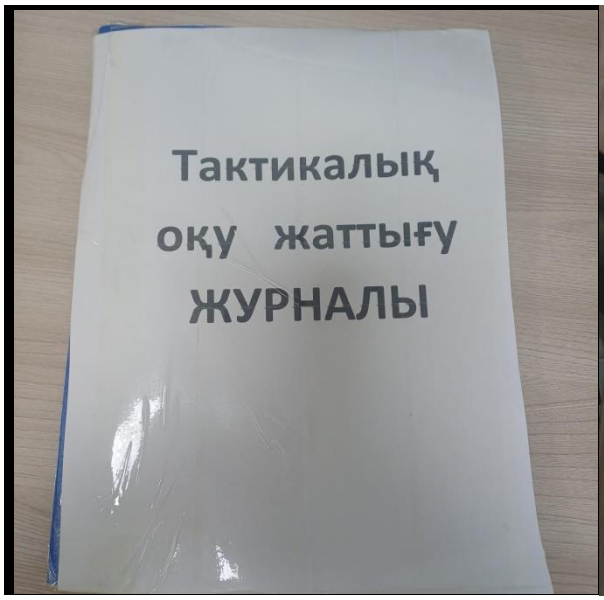




2. Ғимараттың 4, 3, 2 қабатында, 1 қабатында сол жақ бетіндегі дәлізінде 4 дана, кіші спорт залда 3 дана, және қосалқы ғимаратының 2 қабатында дәлізінде 4 дана өрт дабыл қондырғылары жұмысқа жарамсыз күйде. Талапқа сай келтірілсін



3. Найзағайдан қорғау құрылғысына тексеруді жүргізу жүзеге асырылмаған және тексеру белгісі бар журнал әзірленбеген. Талапқа сай келтірілсін.

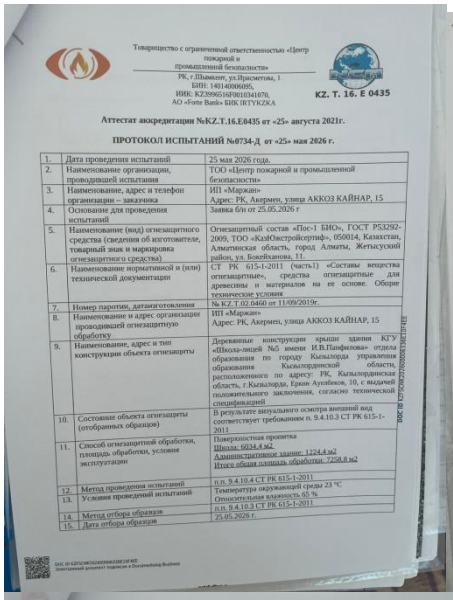

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»
РК, г.Шымкент, ул.Ярасметова, 1
БИН: 140140006605,
ИИК: KZ389651F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0734-Д от «25» мая 2026 г.

1.	Дата проведения испытаний	25 мая 2026 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Маржан» Адрес: РК, Акермен, улица АККОЗ КАЙНАР, 15
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 25.05.2026 г
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «Пос-1 БИО», ГОСТ Р53292-2009, ТОО «КазЮжстройсертиф», 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, ул. Бокейханова, 11.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Номер паротии, датазаготовления	№ KZ.T.02.0460 от 11/09/2019г.
8.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Маржан» Адрес: РК, Акермен, улица АККОЗ КАЙНАР, 15
9.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции крыши здания КГУ «Школа-лицей №5 имени И.В.Панфилова» отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской область, расположенного по адресу: РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Еркин Ауелбеков, 10, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификации
10.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка Школа: 6634,4 м2 Административное здание: 1224,4 м2 Итого общая площадь обработки: 7258,8 м2
12.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
14.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15.	Дата отбора образцов	25.05.2026 г.



Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций огнезащитным составом.

Дата: 25 мая 2026г.
Мы ниже подписавшиеся:
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №5 имени И.В.Панфилова" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области".
Составили настоящий Акт выполненных работ по приемке следующих, обработанных огнезащитным составом «Пос-1 БИО», ГОСТ Р53292-2009.
Адрес: РК., Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕРКИН АУЕЛБЕКОВ, 10

Общая площадь обработанных конструкций _____ м²

Влажность обрабатываемой деревянной конструкции: 5%
Влажность воздуха: 15%
Тип используемые при обработке огнезащитным составом **«Пос-1 БИО»**
Контроль за качеством работы со стороны Заказчика осуществлен.


- Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается 1 год.

Дата следующей огнезащитной обработку деревянных конструкций огнезащитным составом 2027 года.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №5 имени И.В.Панфилова" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕРКИН АУЕЛБЕКОВ, 10

Подрядчик:
ИП "МАРЖАН"

(должность) _____ (подпись) **Руководитель** Сандыбаева М.А.

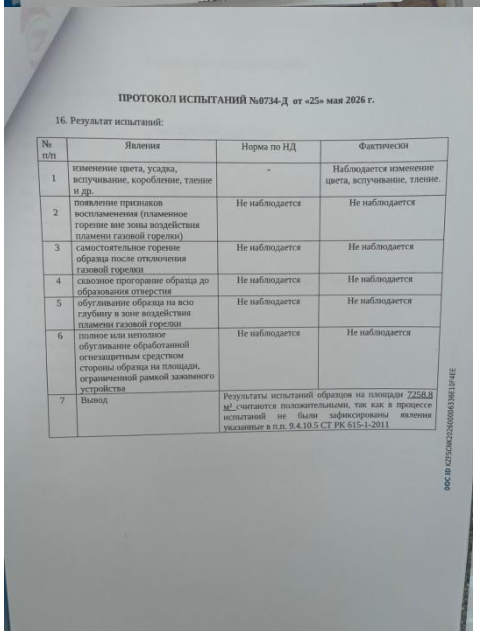


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0734-Д от «25» мая 2026 г.

16. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади 7258,8 м² считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011	

4. Ағаш конструкциялардың оттан қорғайтын өңдеуі мен жабындарының (сіңіруінің) жай-күйін тексеруді сынауларға хаттама жасаумен жүзеге асырылмаған. Талапқа сай келтірілсін.

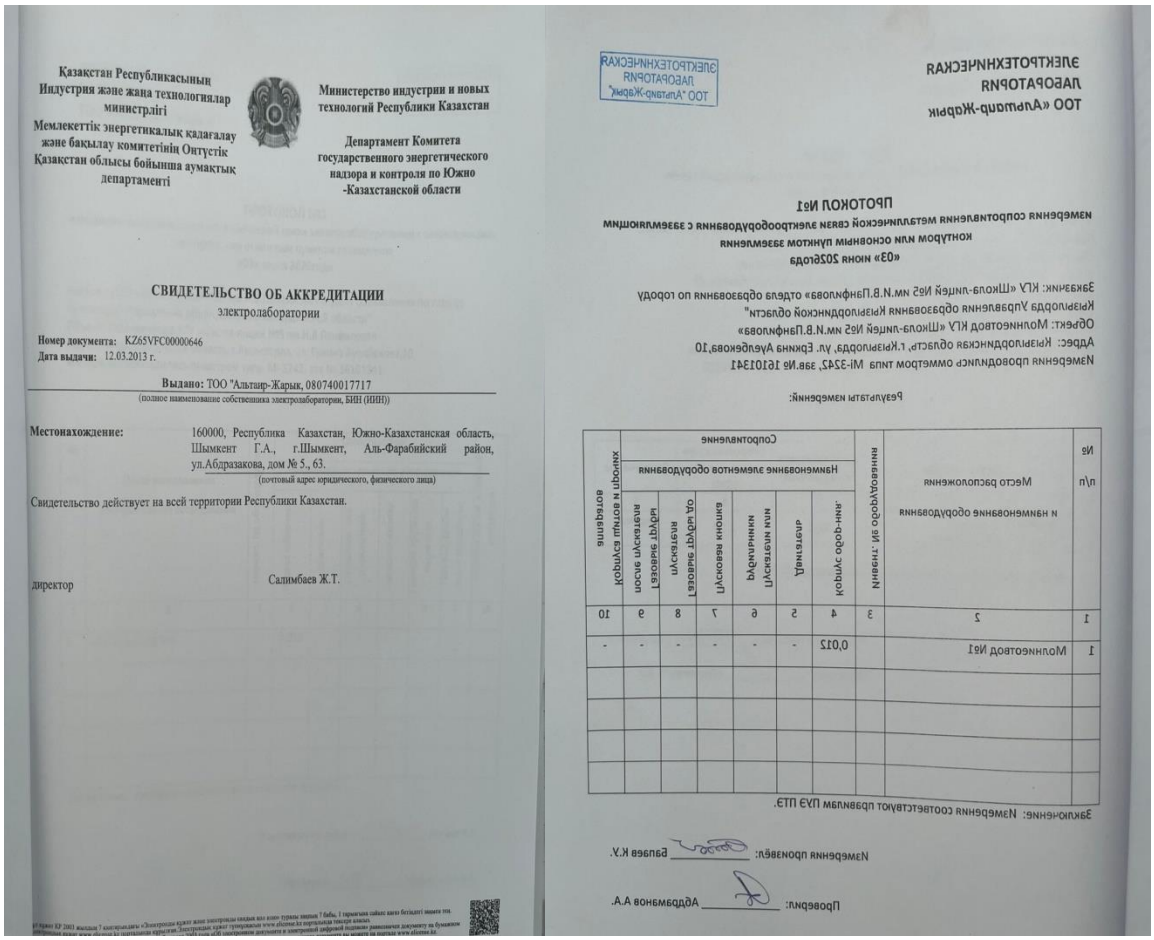

Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі
Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля по Южно -Казахстанской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
электролаборатории

Номер документа: KZ65VFC00000646
Дата выдачи: 12.03.2013 г.

Выдано: ТОО "Альтыр-Жарык, 080740017717
(полное наименование собственника электролаборатории, БИН (ИИН))

Местонахождение: 160000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Абдразакова, дом № 5., 63.
(почтовый адрес юридического, физического лица)

Свидетельство действует на всей территории Республики Казахстан.

директор Салимбаев Ж.Т.

ТОО «Альтыр-Жарык»
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ №1
измерения сопротивления растеканию заземлителя с заземляющим контуром или основным узлом заземления
«03» июня 2025года

Заказчик: КГУ «Школа-лицей №5 им.Н.В.Гоголя» отдела образования по городу
Юридический адрес образования Юридический адрес
Объект: Молниеотвод КГУ «Школа-лицей №5 им.Н.В.Гоголя»
Адрес: Юридический адрес, г.Юридический адрес, ул. Ержана Аубекова,10
Измерения проводились омметром типа Mi-3242, зав.№ 1610134 1

Результаты измерений:

№ п/п	Место расположения и наименование оборудования	Инвентарный № оборудования	Сопротивление заземления оборудования						Характер и состояние грунта
			Норматив	Дата последнего измерения	Дата предыдущего измерения	Сезонный коэффициент	Измеренное сопротивление, Ом	Допустимое сопротивление, Ом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Молниеотвод №1		0,012	-	-	-	-	-	-

Заключение: Измерения соответствуют правилам ПУЭ ПТЭ.

Измерения произвел: _____ Балаев К.У.

Проверил: _____ Абдрахманов А.А.

5. Ғимараттың жертөлесінде жанғыш заттар мен материалдарды сақтауға және жинауға жол берілмесін. Ғимараттың жертөлесінде тазарту жұмыстары жүргізілсін.



6. Қосалқы ғимаратының эвакуациялық шығу жолындағы есігі ішінен кілтсіз еркін ау мүмкіндігі қамтамасыз етілсін.



7.Қосалқы ғимараттың 1-қабатында ,және спорт залда Шығу индекациясы қосулы күйде ұсталмаған .талапқа сай келтірілсін





8.Мектеп ғимаратынын 4-қабатындағы №409 кабинеті ,3-қабатындағы №305 кабинетінде орналасқан екі дана бекітілмеген розеткаларды қолдануға берілген. Талапқа сай келтірілсін.





9.Өткізгіштердің ,кабелдердің және жер тұйықтау құрылғыларынын оқшаулау кедергісін сымын жүргізілмеген .Талапқа сай келтірілсін



10. Мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан стендте розетка жанбайтын негіздері монтаждалмаған. Талапқа сай келтірілсін.





11. Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелерімен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық» және «техникалық қызмет көрсету және жоспарлы – алдын ала жөндеу жұмыстарының жоспар-графтгі әзірленбеген. Құжаттар талапқа сай әзірленсін.

